



現在、水槽本体を支える地中梁の鉄筋組立、コンクリート打設工事を主に実施しており、1 - 1水槽、1 - 2水槽については、今月中に完了する予定です。
基礎杭については、使用中の第3水槽を除き今月中に完了する予定です。
これから、水槽本体の底版補強コンクリート等、本体補強工事に本格的に入ります。

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。

財団法人 宮崎県環境整備公社 建設課
TEL 0985 - 30 - 6511
不動テトラ・西條・五幸特定建設工事共同企業体
TEL 0985 - 73 - 8301

3月末の進捗率 37.7%(見込み)

今月の作業状況

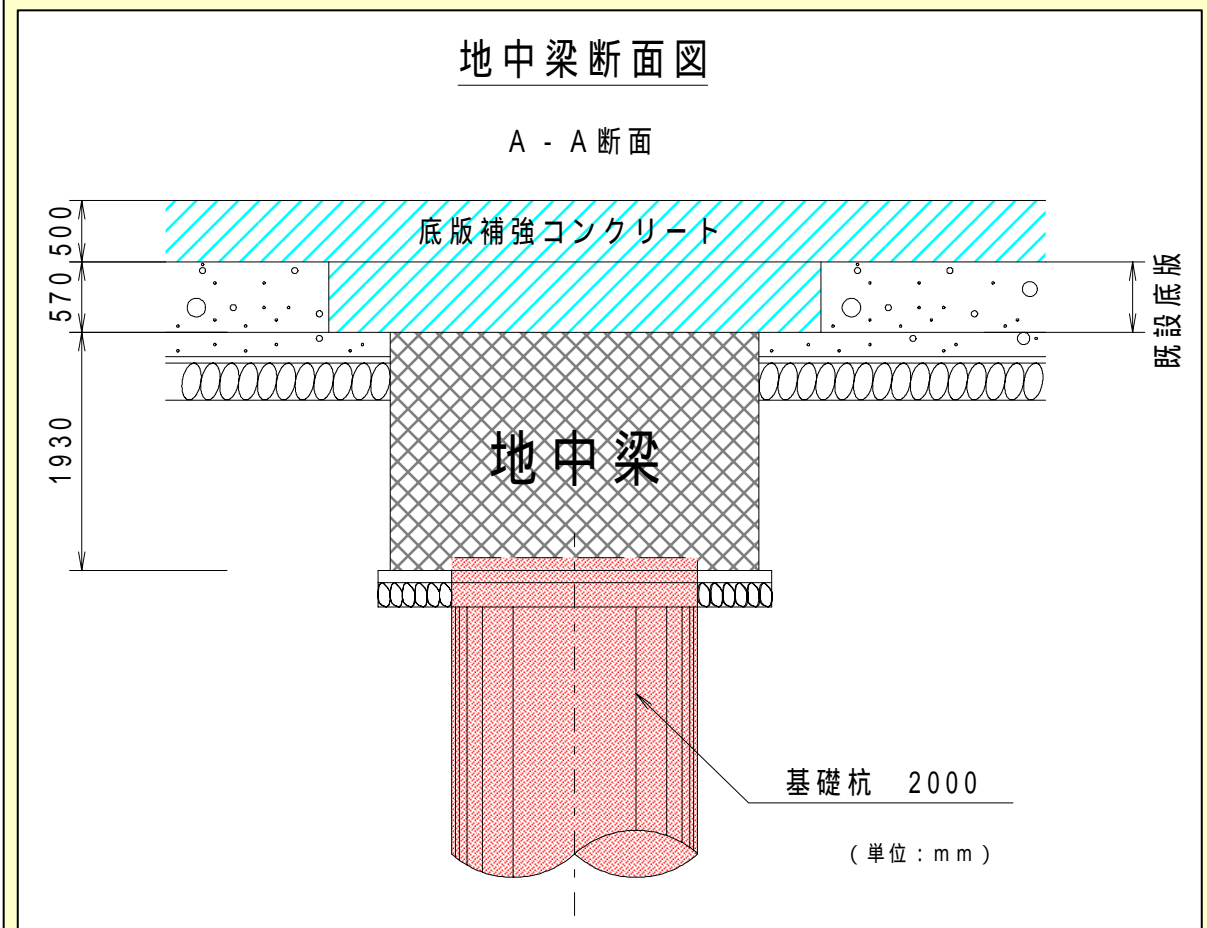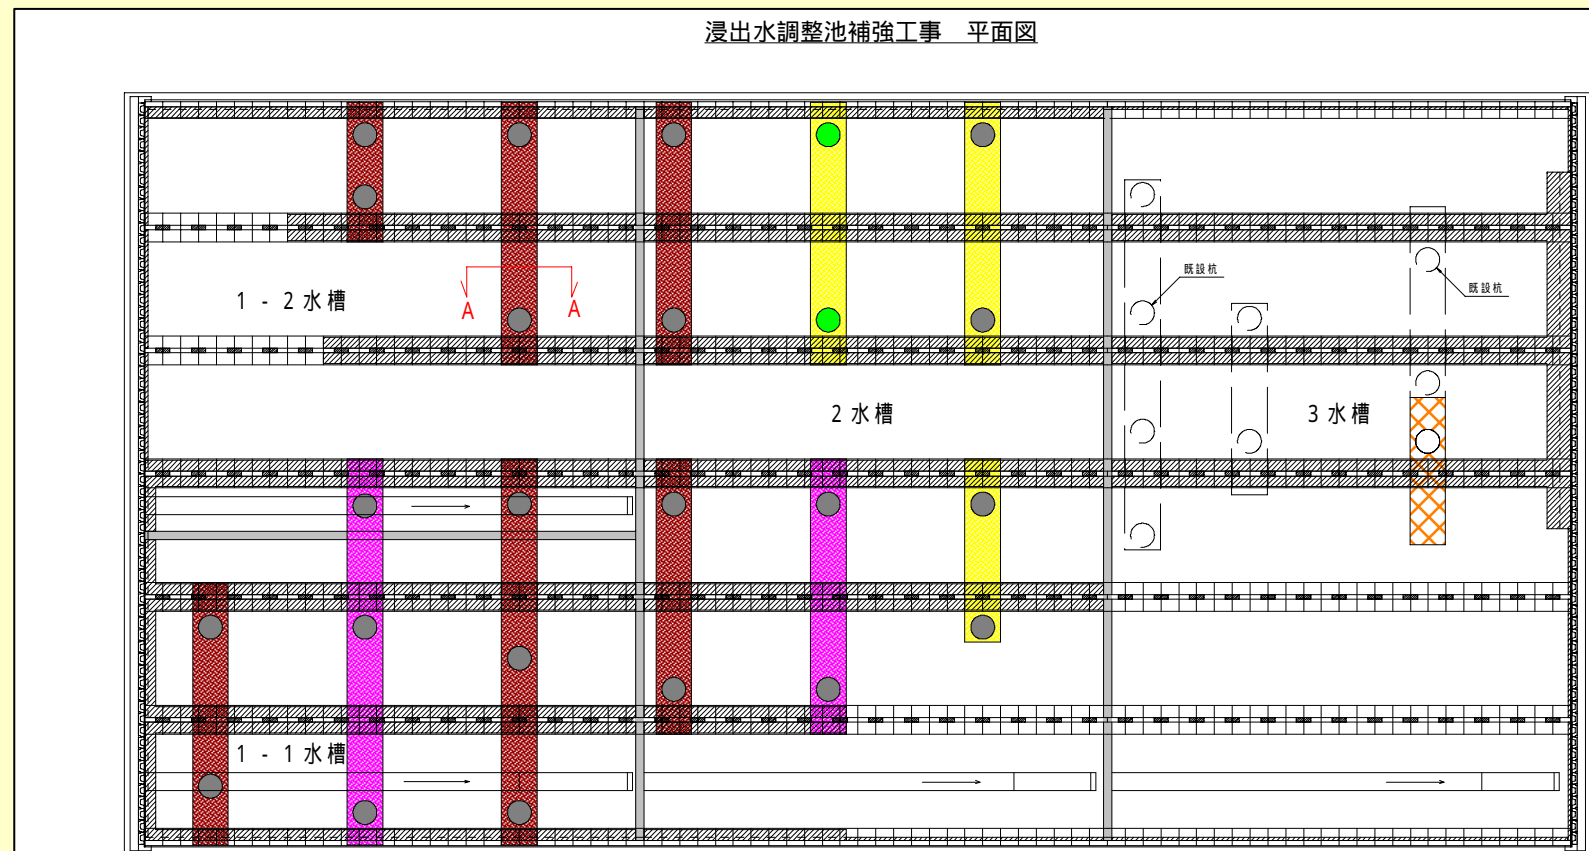

3月26日現在の進捗状況

基礎杭の状況 ● コンクリート打設完了：2本 ● 鉄筋組立及び完了：2本 ○ 未施工箇所：1本（第3水槽）
地中梁の状況 ■ コンクリート打設完了：6基 ■ 鉄筋組立及び完了：2基 ■ 掘削完了：3基 ■ 未施工箇所：1基（第3水槽）

地中梁工事一連の作業状況

