

第2水槽については、コンクリート打設が完了しました。ひび割れについては、最小限に抑えることができました。今後、ひび割れの補修やコンクリート表面のケレン作業後、水張り試験を行う予定としております。
 第3水槽については、インバートコンクリート撤去後、深礎杭の施工を行うとともに、底版部の鉄筋組立を行い、一部コンクリートの打設を行っております。引き続き地中梁や本体補強工事を行う予定としております。
 目的どおりの池を12月末に完成させるために鋭意工事を進めてまいります。

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。
 財団法人 宮崎県環境整備公社 建設課
 TEL 0985-30-6511
 不動テトラ・西條・五幸特定建設工事共同企業体
 TEL 0985-73-8301

6月末の進捗率 72.0%

第3水槽




深礎杭掘削状況




底版コンクリート打設状況

浸出水調整池補強工事 平面図

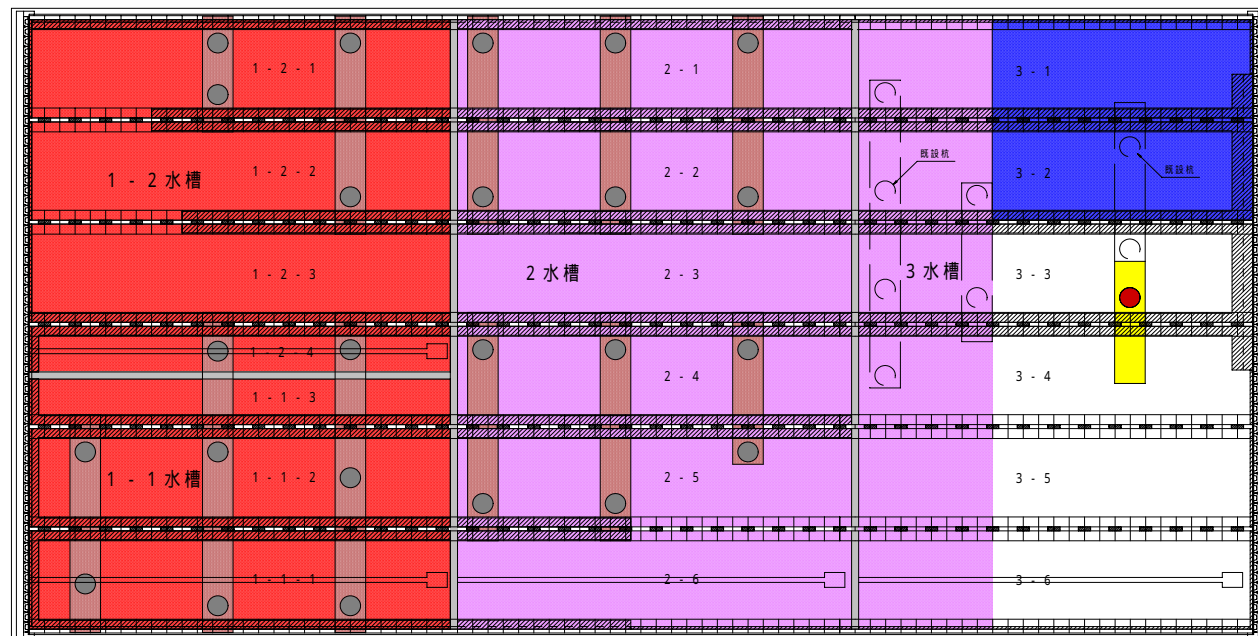

断面図

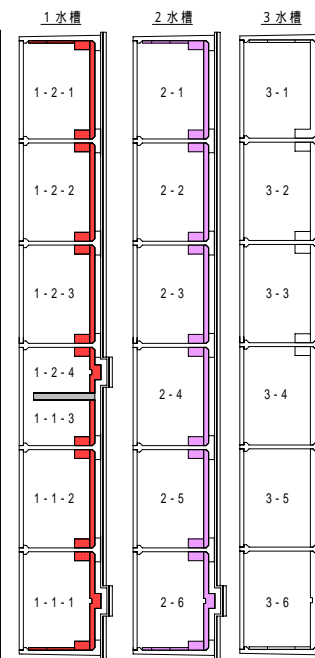

7月15日現在の進捗状況

- | | | |
|----------|-----------------|-----------------|
| 基礎杭の状況 | ● 1水槽・2水槽完了：24本 | ● 施工箇所：1本(第3水槽) |
| 地中梁の状況 | ■ 1水槽・2水槽完了：11基 | ■ 施工箇所：1基(第3水槽) |
| 本体補強工の状況 | ■ 底版鉄筋組立中及び完了 | ■ 底版コンクリート打設完了 |
| | ■ 縦桁鉄筋組立中及び完了 | ■ 縦桁コンクリート打設完了 |
| | ■ 増壁鉄筋組立中及び完了 | ■ 増壁コンクリート打設完了 |
| | | ■ 完成 |

第2水槽



コンクリート打設完了



コンクリート打設完了
