


現在、水槽本体を支える基礎杭の掘削工事を進めており、10/29日時点で6本の杭について、支持地盤までの掘削が完了しました。その他の杭についても順次掘削を進めております。
掘削完了した箇所については、今後、掘削孔内に鉄筋を挿入した上で、生コンクリートを打設し、基礎杭を構築していきます。

ご意見等がありましたら、下記までご連絡下さい。
財団法人 宮崎県環境整備公社 建設課
TEL 0985-30-6511
不動テトラ・西條・五幸特定建設工事共同企業体
TEL 0985-73-8301

今月の作業状況

10月迄の進捗率 25.0%

平面図

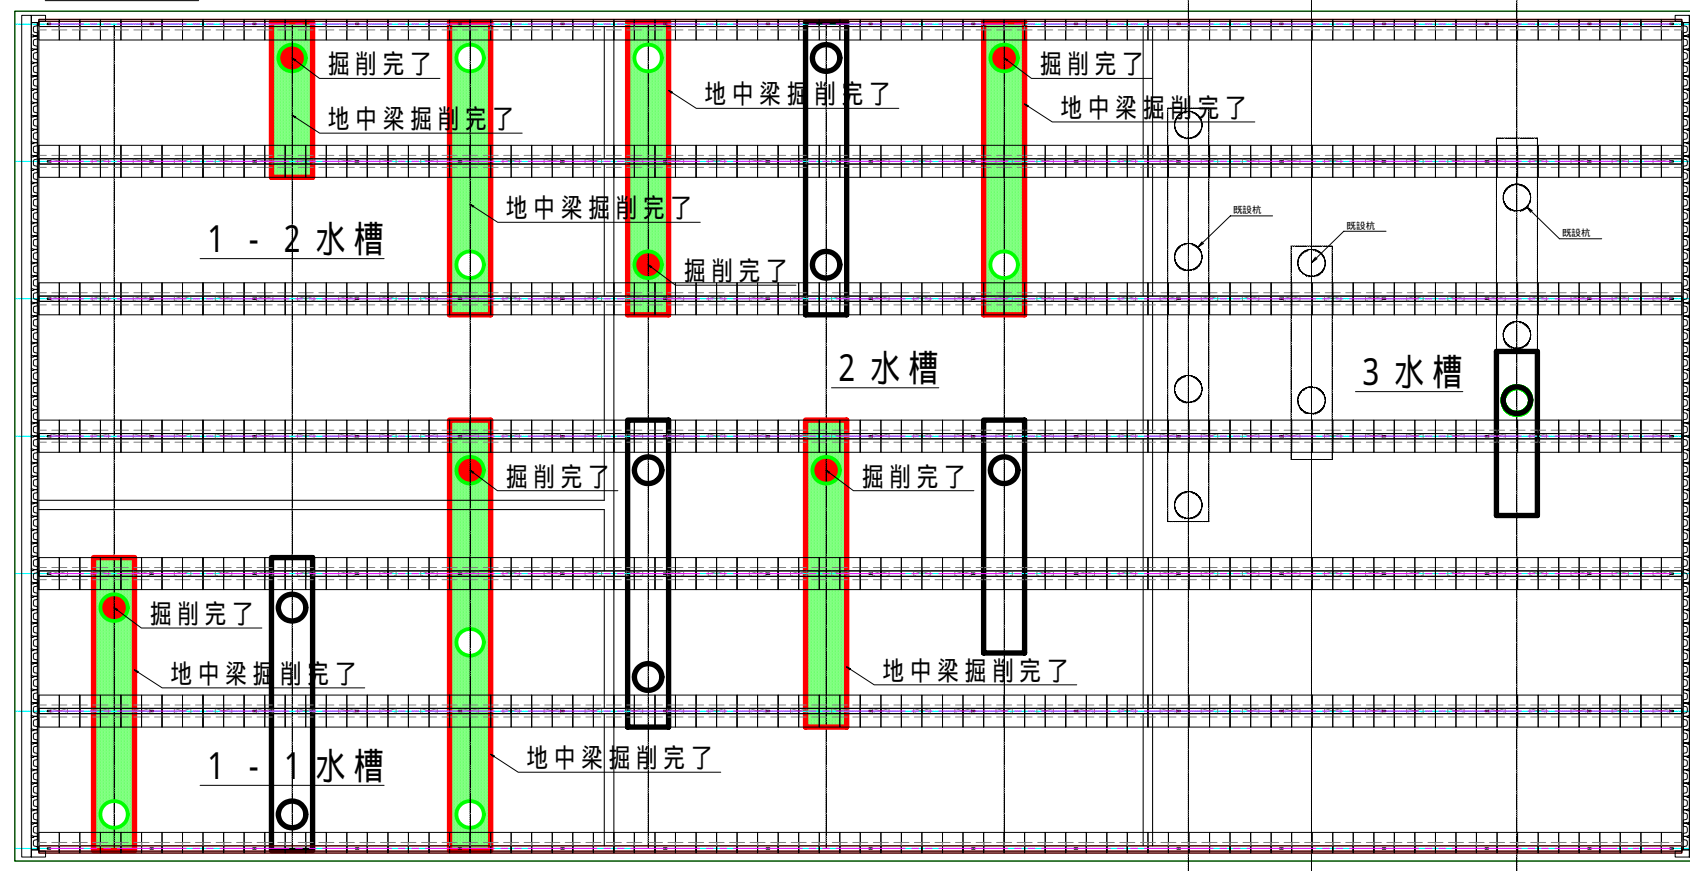

掘削した土砂は、ウインチにて排土します。



掘削した箇所は、随時、型枠を組立ていきます。

深礎杭工事一連の作業状況



作業構台上より、機械にて掘削しています。



機械掘削出来ない深さは、人力にて掘削します。



設計深度まで掘削したら支持層の確認をします。
