

エコクリーンプラザみやざき 下水道放流施設整備工事

現場便り 第2号(平成23年 11月)

平成23年11月18日発行

財団法人 宮崎県環境整備公社


【場外工事】エコクリーンプラザみやざきから宮崎市広原の公共下水道までの延長約6kmの下水道接続管布設工事は、10月末現在の工事進捗率は全体で約63%となっており、順調に工事が進んでおります。

【場内工事】浸出水処理水を一時貯留するための水槽改造工事は、内部仕切壁の設置を経て、防食塗装工事を施工中であります。
また、浸出水処理水送水ポンプ施設工事は、浸出水処理水を場外へ送水するポンプを新たに設置し、一部の調整を残すのみとなりました。
安心・安全・安定したごみ処理システムを構築するために、今後とも円滑な工事の促進を図り本年度内の完成に努めます。

【 場内工事】

【 場外工事】

◎ 場内工事の全体平面図

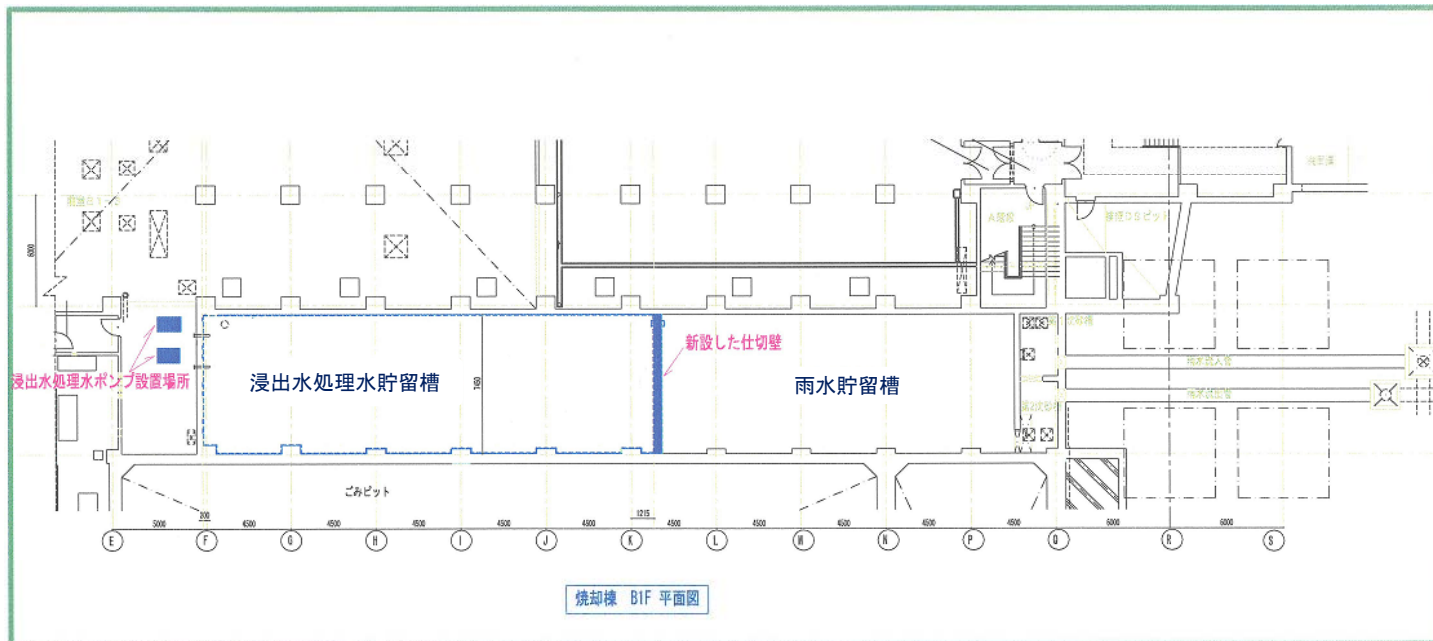

◎ 下水道接続管布設工事の現状



管布設後の仮復旧の状況
(県道宮崎高鍋線立体交差付近)



配管接続状況
(屋内配管と屋外配管接続部)



ポリエチレン管継手状況
(電気融着)



突起物が出てくれば
正常に融着(接合)さ
れたこととなります。

※工事中の交通規制に御協力をお願いします。お尋ねの点がありましたら、下記までお問い合わせ下さい。
財団法人 宮崎県環境整備公社 建設課、施設運営課
TEL 0985-30-6511
FAX 0985-30-6516

◎ 貯水槽改造工事の現状



浸出水処理水を場外へ送水する前に、一時貯留するための水槽が必要です。このため、既存の水槽を改造して、仕切壁を造ります。仕切壁のコンクリート工事が完了しました。



改造工事をする水槽内部では、防食塗装工事に着手しています。

◎ 浸出水処理水送水ポンプ施設工事の現状



浸出水処理水を場外へ送水する新たなポンプを設置しました。

平成23年10月末現在

・場外工事進捗率	
全体	(62.6%)
第1工区	(70.7%)
第2工区	(53.4%)
第3工区	(64.9%)
