

# エコクリーンプラザみやざき 下水道放流施設整備工事

## 現場便り 第3号(平成23年 12月)

平成24年1月6日発行  
財団法人 宮崎県環境整備公社

工事全体につきましては、12月末での工事進捗率が約92%と順調に進んでおり、当初予定より早い時期に完了する見込みであります。

【場外工事】エコクリーンプラザみやざきから宮崎市広原の公共下水道までの下水道接続管敷設工事については、延長約6kmの管布設を完了し、現在、舗装復旧工事を行っております。

【場内工事】浸出水処理水を一時貯留するための水槽改造工事は、12月に完成しました。

また、浸出水処理水送水ポンプ施設工事は、浸出水処理水を場外へ送水するポンプの設置も終わり、制御盤等の調整を残すのみとなりました。

### 【 場外工事 】

### 【 場内工事 】


#### ◎ 下水道接続管敷設の状況




橋梁添架管足場設置状況  
(畑倉谷1号橋)



橋梁添架管敷設状況  
(畑倉谷1号橋)

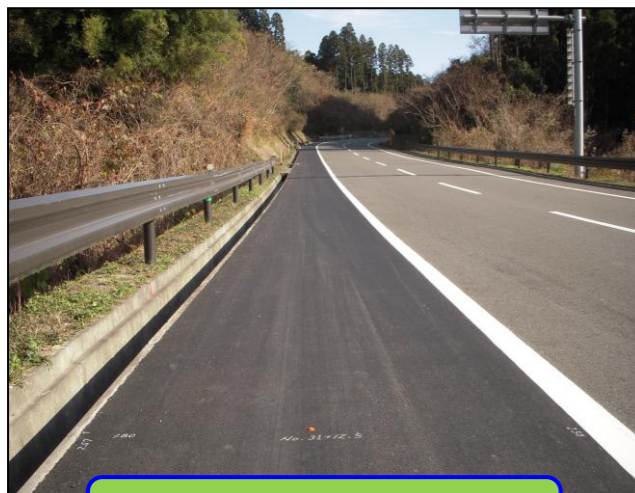

本復旧の状況(1工区)

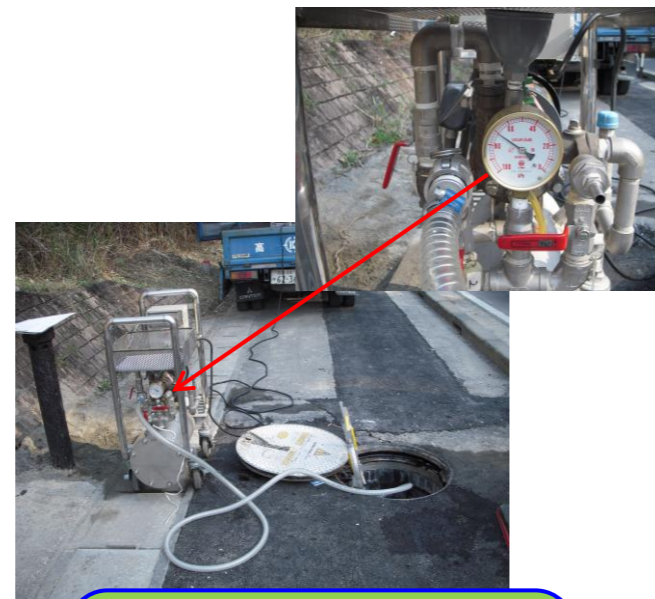

気密試験  
管路内に負圧(70KPA)をかけて1時間保持し、接続不良箇所がないか確認をします。

#### ◎ 貯留槽改造工事完成



完成

#### ◎ 浸出水処理水送水ポンプ施設工事の現状



制御盤設置状況

平成23年12月末現在	
・進捗率	
全体	( 91.8%)
(場内工事)	
ポンプ施設工事	( 90.0%)
貯留槽改造工事	(100.0%)
(場外工事)	
第1工区	(100.0%)
第2工区	( 80.3%)
第3工区	( 95.0%)

※工事中の交通規制に御協力をお願いします。お尋ねの点がありましたら、下記までお問い合わせ下さい。  
財団法人 宮崎県環境整備公社 建設課、施設運営課  
TEL 0985-30-6511  
FAX 0985-30-6516
