

エコクリーンプラザみやざき 浸出水調整池補強工事

財団法人 宮崎県環境整備公社

現場便り 第1号(平成21年3月)

これから毎月、現場状況をお伝えしていきます。

現場位置図



着手前の写真



当月の作業状況



安全祈願祭


3/3に工事の安全を願い安全祈願祭を実施しました。



調査ボーリング
地下埋設物を調査
しています。

工法概要

調整池の地下に場所打ちコンクリート杭を21本つくり調整池を支えさらに、耐震のため内側にコンクリートを打設します。

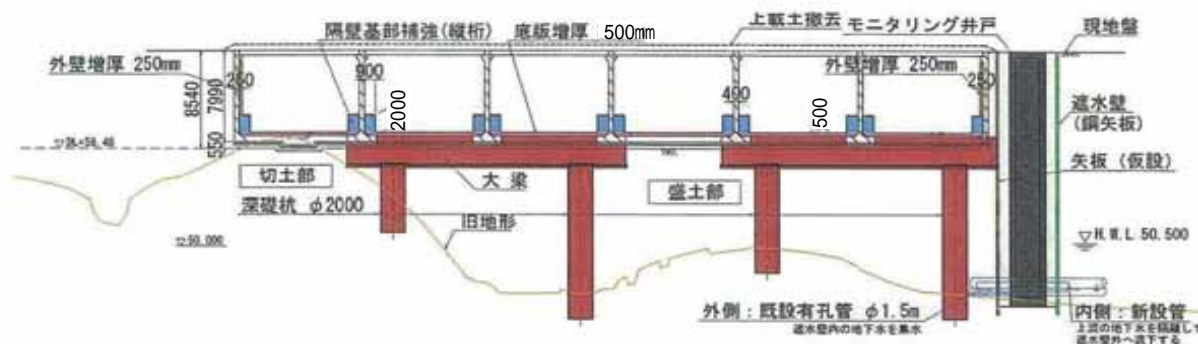

工事内容

工 事 名: エコクリーンプラザみやざき 浸出水調整池補強工事
 工 期: 平成21年2月10日～平成22年5月31日
 工事金額: 122,850 万円

工事概要: 深礎杭 (2.0m) N=21本
 地中梁工 N=12基
 水槽本体補強工 一式

発注者: 財団法人 宮崎県環境整備公社
 TEL0985-30-6511

総括監督員 入船 修二
 主任監督員 坂本 達郎
 施工者: 不動テトラ・西條・五幸特定建設工事共同企業体
 現場代理人 中島 卓 TEL0985-73-8301
 監理技術者 山岸 真一
 主任技術者 山田 達矢
 主任技術者 飯干 憲二

次回のお便りは、4月15日ごろに発行します。
